

Descripción:

Modernización de un camino rural a nivel terracerías de 9.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 9.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido) y acotamiento, en una longitud total de 60.0 km, de los cuales se tienen modernizados 25.0 km y se tienen pendientes de modernizar 35.0 km del km 25+000 al km 60+000 incluye la construcción de un puente.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2011	Término: Dic-2026
MONTO Y META TOTAL	1800.0 mdp	60 km, 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	202.0	25 km
PEF 2023	0	0.0 km
Posterior a 2023	1,598.0	35.0 km y 1 puente

Avance Global (%)	
Avance físico:	41.7
Avance financiero:	11.2



Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 6 horas.
- TDPA: 700
- Población beneficiada: 600,000 habitantes de los municipios del norte de Sinaloa.

Elementos TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo en proceso
Económica (Registro UI-SHCP)	No se dispone
Legal (Derecho de Vía)	No se dispone
Ambiental	No se dispone
Social	Se dispone

Justificación:


Mejora en la conexión de la zona noreste del estado, favoreciendo la comunicación de la población en la zona de la sierra, permitiendo el acceso a salud educación y comercio.



Empleos Generados:

- Directos: 2,431
- Indirectos: 9,724



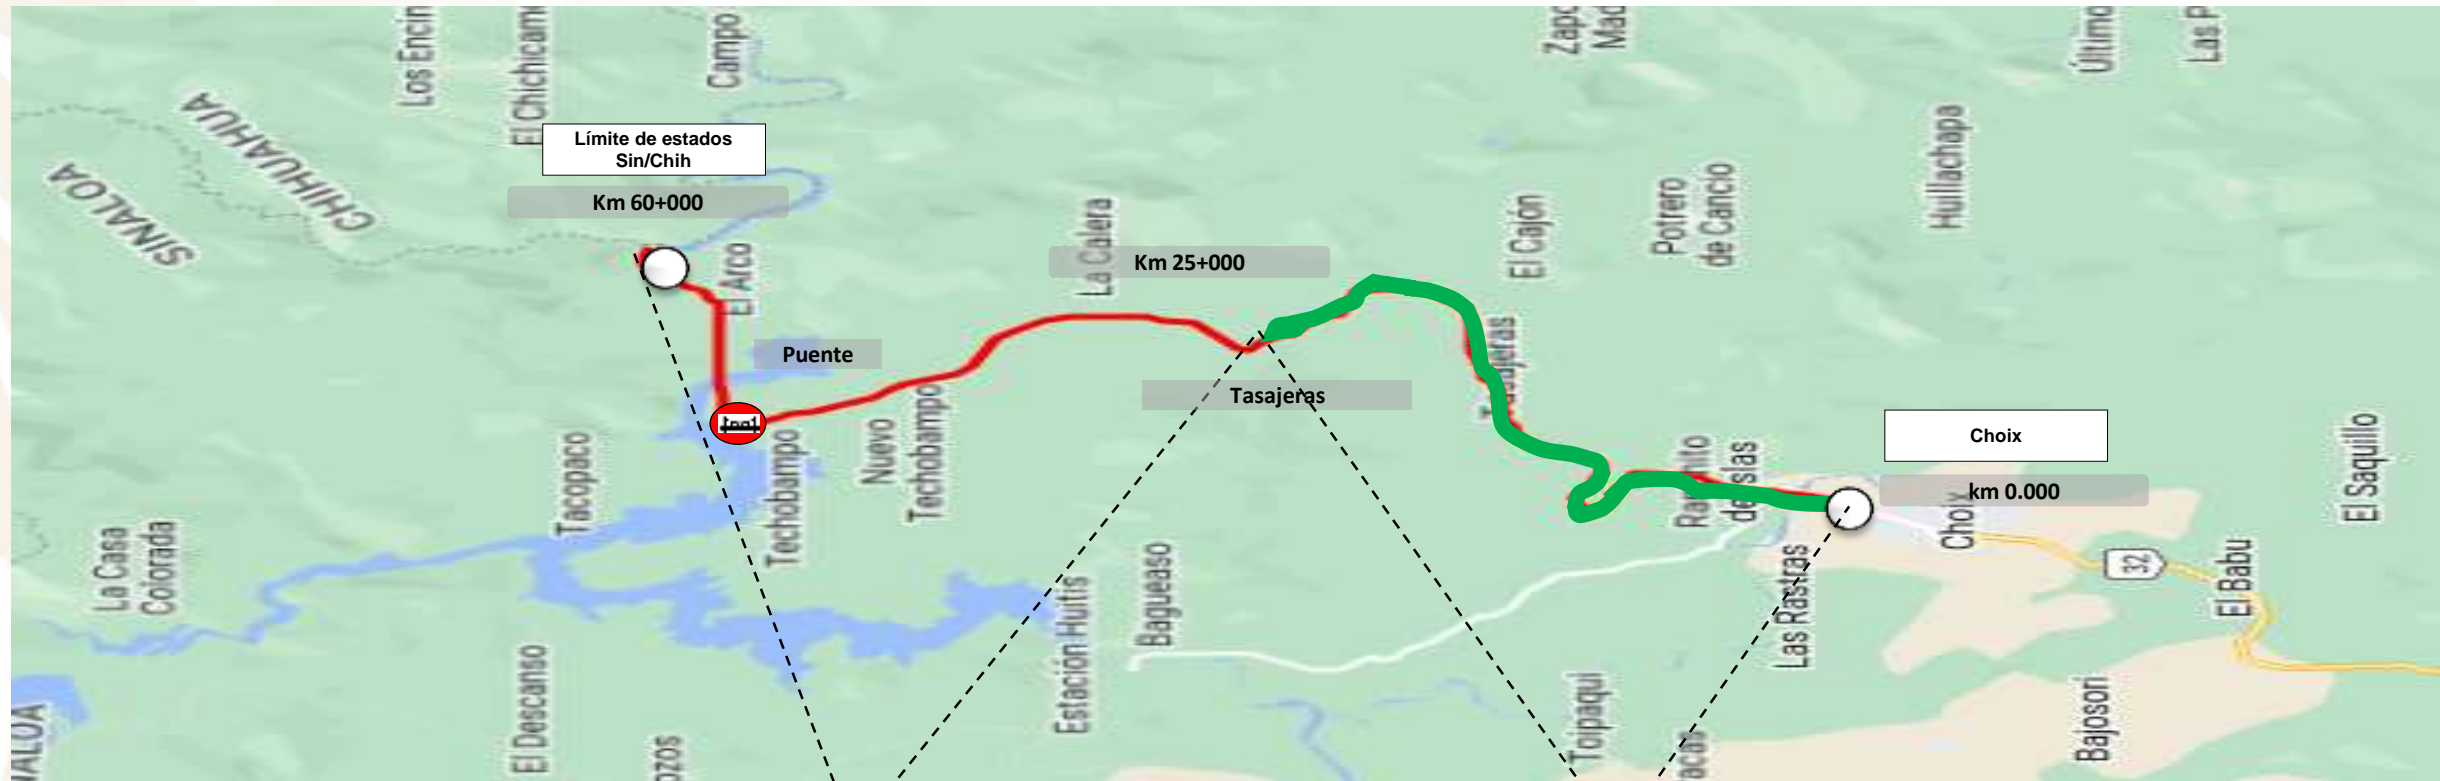

Meta: 35.0 km y 1 puente
Del km 25+000 al km 60+000

Meta: 25.0 km
Del km 0+000 al km 25+000



En operación



En construcción



Por modernizar

